

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree


INHOUD

—
Tegelwerk gereed
—

**Werkzaamheden
komende week**
—

"Proef" stoelen
—

**Geen toegang op de
bouwplaats**

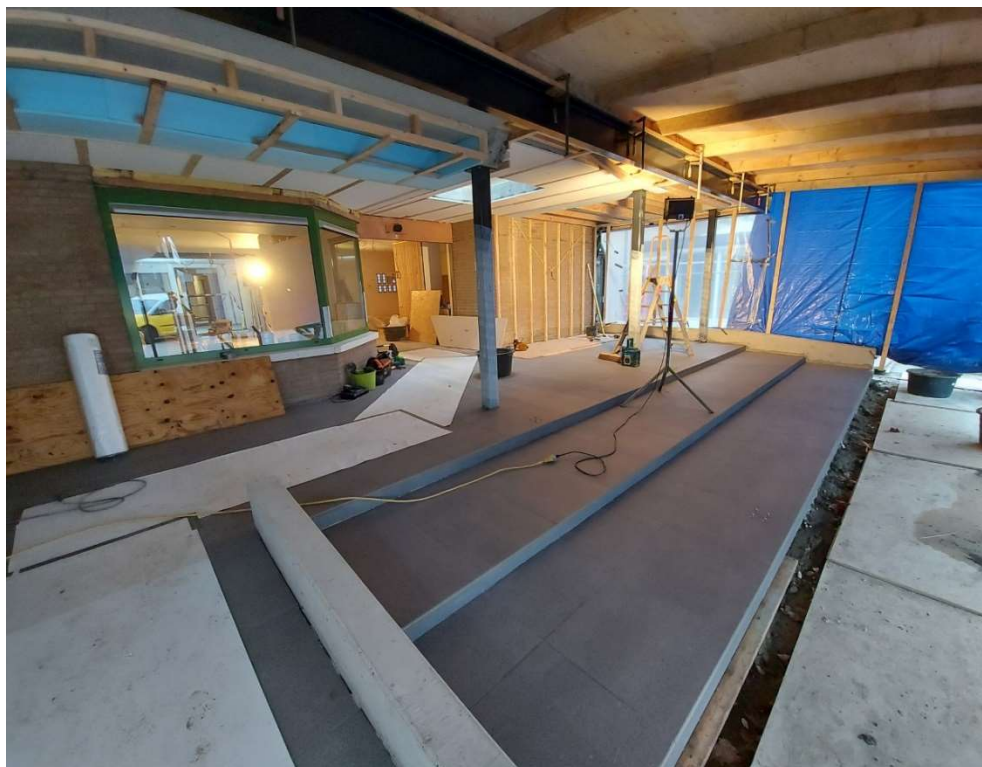

Tegelwerk gereed

Het tegelen van de trappen en de hellingbaan is gereed. Er wordt nu gewerkt aan de afwerking van de rechter wand met eiken panelen en aan het plafond van de luifel.

Voor de aannemer is het prettig dat de tent nog even kan blijven staan, dat werkt prettiger vanwege de buitentemperatuur en is ook fijn als het regent.

Om koude wat tegen te gaan zijn er tijdelijke voordeuren gemaakt. De "vorste" voordeur moest gedemonteerd worden in verband met het tegelwerk wat iets naar binnen doorloopt. Deze tijdelijke deuren nemen tocht weg en houden de koude wat meer buiten.

De systeemplafonds zijn ondertussen ook dichtgelegd, dat geeft al een ander zicht.

De schilder heeft het plafond bij gewerkt zodat dit verder afgewerkt kan worden.

Stap voor stap meer zichtwerk,
we naderen de laatste verbouwingsmaand!

Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning. Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen.

Graag uw begrip hiervoor!





"Proef" stoelen

Op de tweede verdieping (bij de leestafel) staan een aantal proefstoelen, als voorstel voor de nieuwe leestafel en voor het zitje nabij de entree. Bekleding en kleurtoepassing van deze stoelen zijn nog nader te bepalen. We horen graag wat u van deze stoelen vindt.

Werkzaamheden komende week

Volgende week worden de bouwkundige werkzaamheden binnen zoveel mogelijk afgerond.

De eiken bekledingen worden afgerond en de deuren zullen ingehangen worden, mits deze tijdig geleverd worden.

Op 1, 2 en 3 december worden de nieuwe automatische schuifdeuren gemonteerd door firma Aaproteq.

Firma Melieste plaats glas in onder andere de kapsalon op 2 en 3 december.

De schilder zal de plafonds afwerken en gaat verder met het verfwerk.

Eind week 48 is de bouwplaats opgeruimd zodat TMC met de vloeren aan de slag kan vanaf 6 december.

Geen toegang op de bouwplaats

We merken dat steeds meer bewoners en bezoekers over de bouwplaats lopen.

Tijdens werkdagen is dit zonder begeleiding van de receptioniste NIET TOEGESTAAN.

In de komende weken wordt er aan het interieur gewerkt. Het is niet prettig dat de bouwlieden steeds hun werk moeten onderbreken.

Opnieuw is er rood-wit lint gespannen om de bouwplaats te markeren. We rekenen op ieders medewerking!

